


北林校发〔2015〕38号-1 工程变更、洽商签订程序

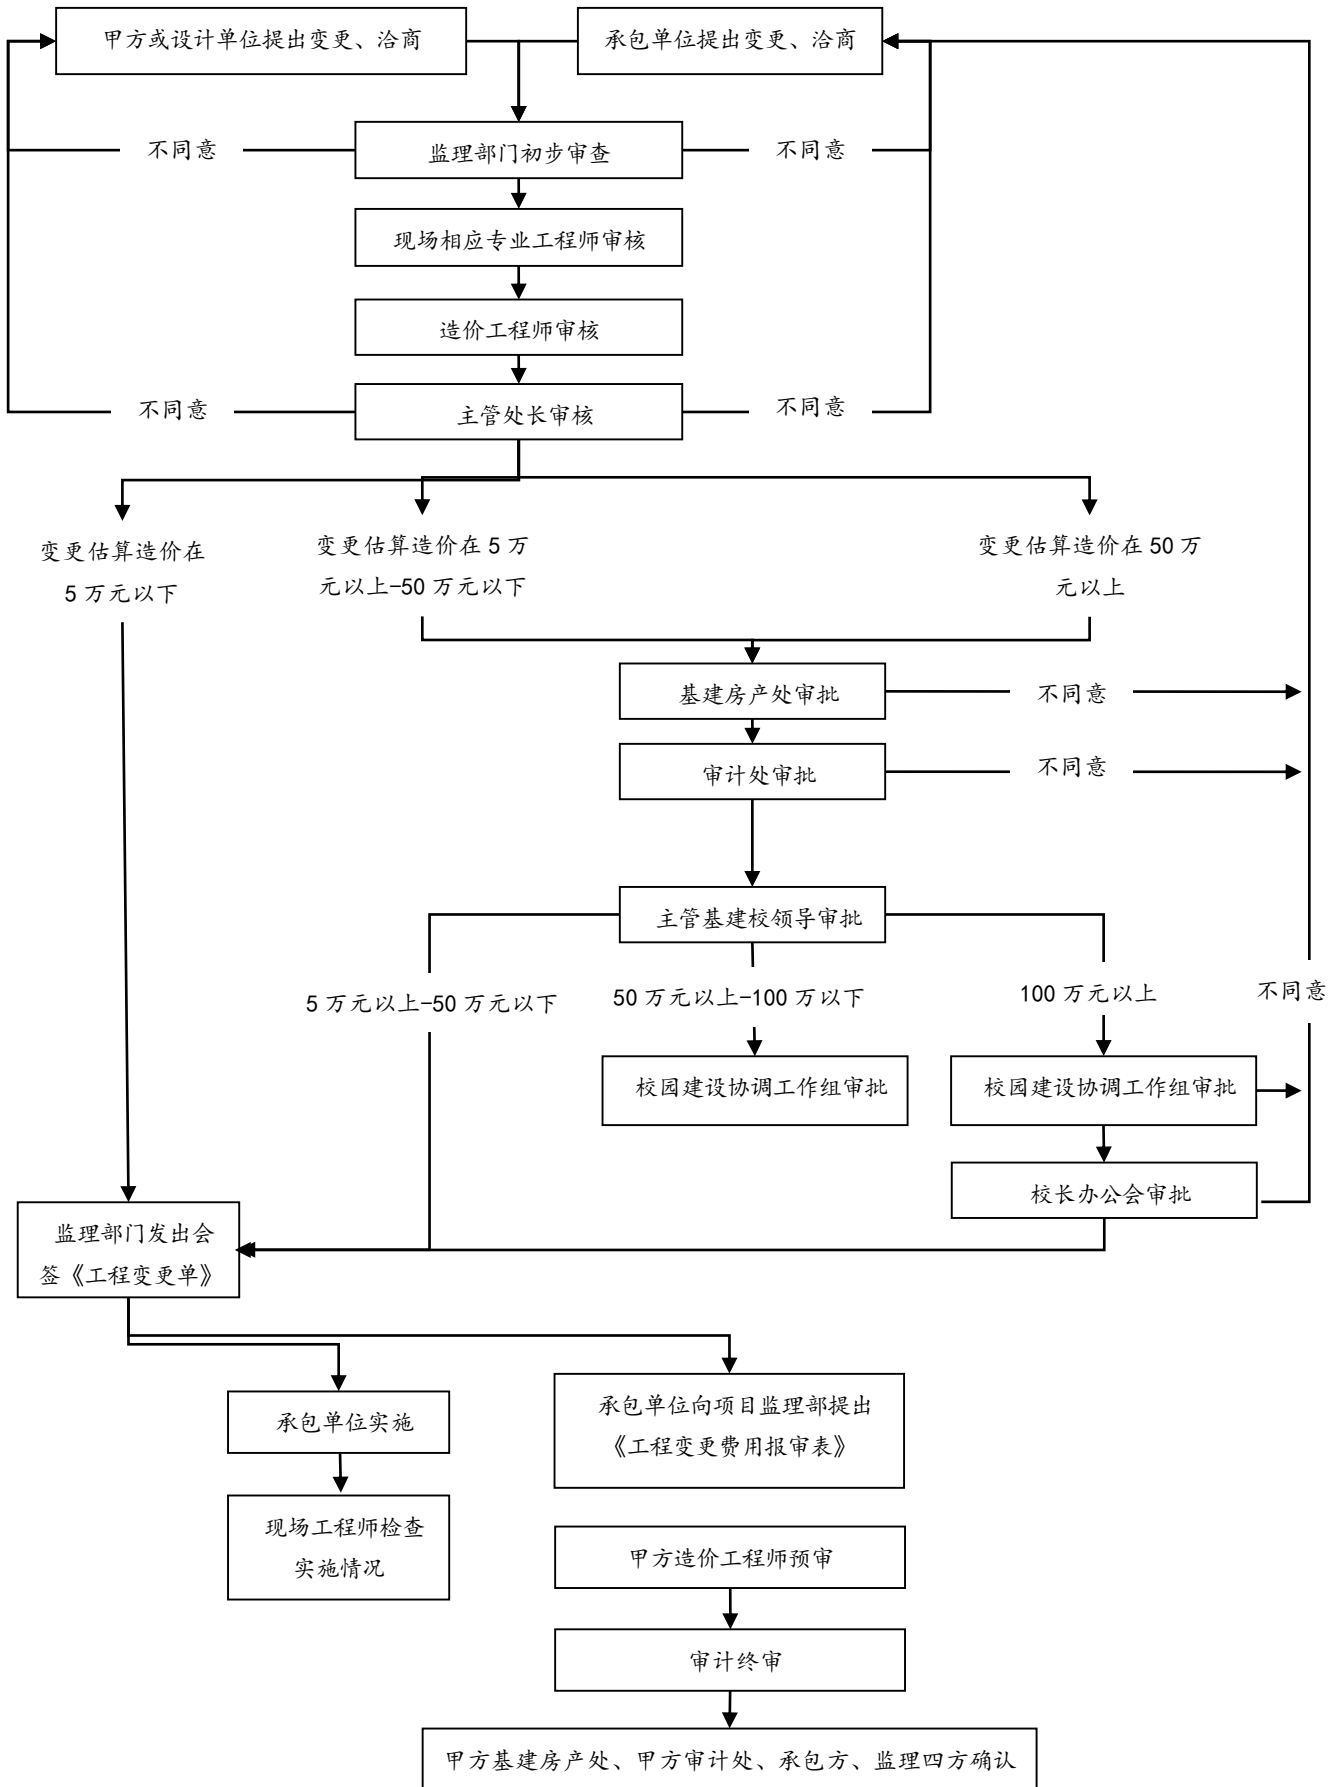


北林校发〔2015〕38号-2 工程变更、洽商内部核准单

工程变更、洽商内部核准单		编 号	洽核-000
工程名称		日 期	
由于 _____ 的原因，_____单位提出 工程变更（内容详见附件），请审批。 附件：			
现场相关专业工程师申报意见： 日期：			
审 批 意 见	1、造价工程师申报意见：预计造价增减数为：_____		
	签 字：_____ 日期：_____		
	2、基建房产处主管副处长审核意见：		
	签 字：_____ 日期：_____		
	3、基建房产处处长审核意见：		
	签 字：_____ 日期：_____		
	4、审计处审核意见：		
签 字：_____ 日期：_____			
5、主管基建校领导审批意见：			
签 字：_____ 日期：_____			
6、校园建设协调工作组组长审批意见：			
组长签字：_____ 日期：_____			
7、校长办公会（或常委会）审批意见：			
校长签字：_____ 日期：_____			

注：1、变更造价5万元以下的，审批意见栏只需填到第2项审批意见即可；变更造价50万元以下的，审批意见需填至第5项；变更造价50万元以上的，审批意见要填至第7项；2、本表经有关人员会签后，由现场资料员留存，竣工后向学校归档。3、工程现场根据审核意见办理变更或洽商。

北林校发〔2015〕38号-3 材料、设备认价程序

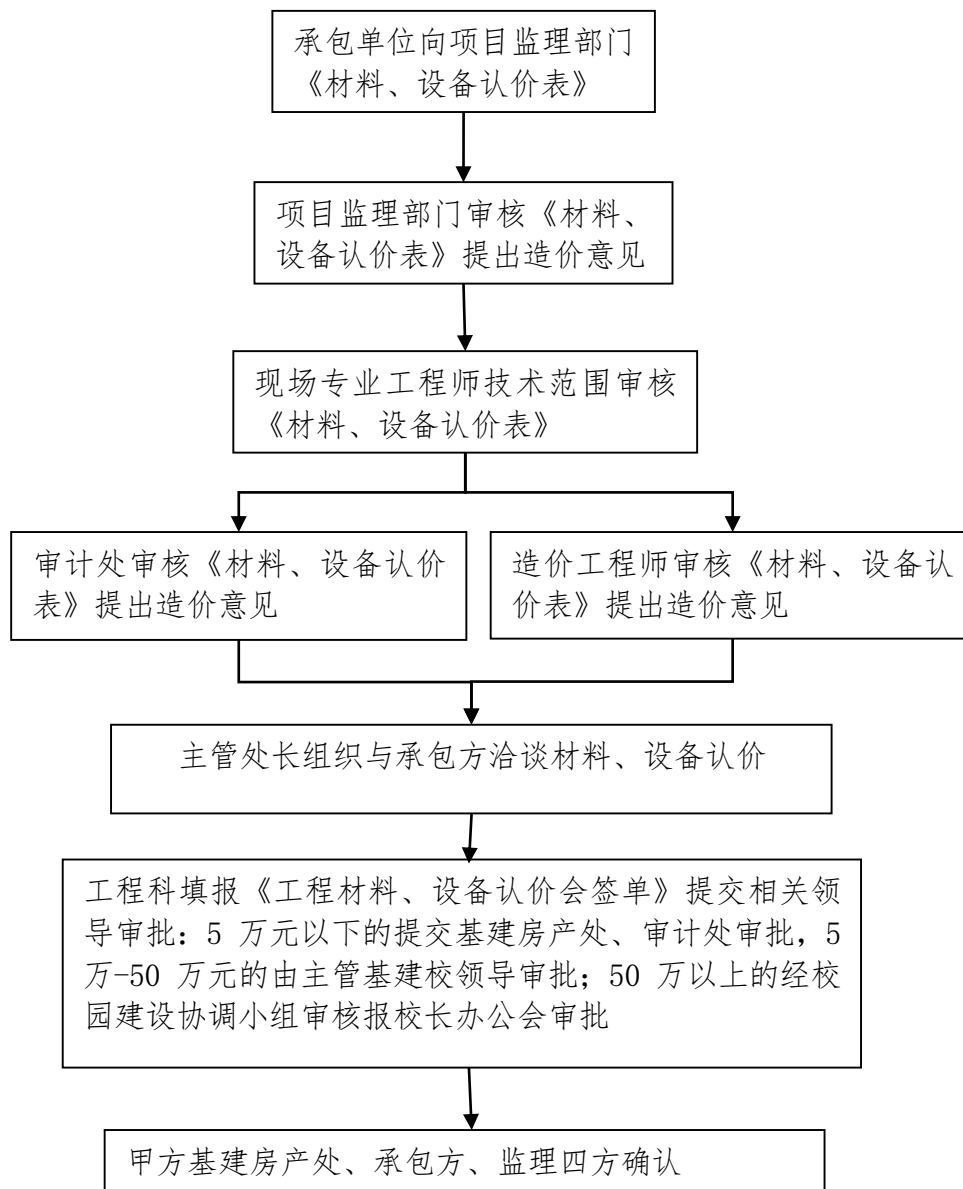

北林校发〔2015〕38号-5 工程材料、设备认价确认单

工程材料、设备及构件认价确认单

序号	名称	品牌	型号	数量单位	暂估数量	暂估单 价	申报单价 (元)	确认单 价(元)	备注	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
基建房产处主管副处长 签字:				监理单位 签字:			施工单位签字:			

北林校发〔2015〕38号-6 现场工程签证程序

